

液状化対策工事の進捗状況と予定

栗崎小学校周辺で進めている液状化対策工事(1-1工区)のうち5区間で集排水管の設置が完了し、進捗率が46%になりました。


残る3区間においても、工事中(日中)は作業音や交通規制など、ご不便をおかけしますが、安全第一で鋭意進めてまいりますので、引き続き、ご理解とご協力をお願いします。



※集排水管の設置後も管口に栓をしているため、地下水の排水は行われていません。下流側の完成に合わせて開栓する予定です。

小学校前の道路拡幅に向け電柱を移設予定

栗崎小学校前の道路復旧(拡幅)に伴い、**支障となる小学校敷地内の電柱**を8月頃に移設する予定です。これに先立ち、影響のある樹木の伐採を実施しました。

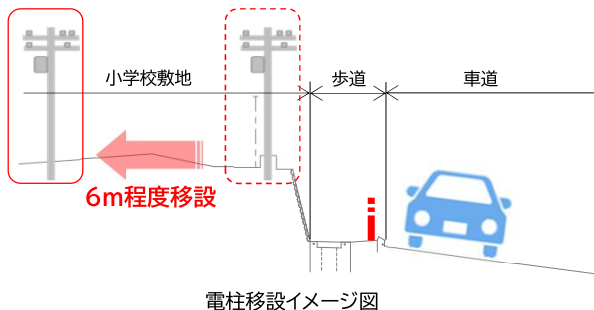

湊簡易グラウンドで水防訓練開催

5月31日(日)、栗崎及び鞍月校下を対象に水防訓練が開催されました。水防訓練は、大雨に備え毎年場所を変えて開催され、今回は、大雨による大野川の氾濫を想定した訓練が行われました。国が所有する排水ポンプ車による訓練が初めて実施されたほか、同時に行われた水防講習会では、地元自主防災会の方々が生かす土のう作りや積み方を再確認し、大雨に備えました。北陸地方は6月20日に梅雨入りしました。万が一の大雨災害の際に適切な行動がとれるよう、ハザードマップを確認し、日ごろから備えていきましょう。



【交通規制のお知らせ】

工事に伴い引き続き、**小学校前の道路が昼間通行止め**になります。誘導員を配置しますので、う回のご協力をお願いします。新たに**交通規制情報**をHPに掲載しました。随時更新しますので、ご確認ください。



小学校周辺エリアの施工業者決定 & 神社・墓地エリアを前倒し



【小学校周辺エリア】

残る液状化対策工事の施工業者が決定しました。
1-2工区: 大三・内川特定建設工事共同企業体
1-3工区: 加賀・北興特定建設工事共同企業体
次号(No.21)で現場代理人等を紹介します。

【神社・墓地エリア】

前倒しで進める地籍再調査に合わせ、切れ目のない復旧推進に向け、令和9年度に予定していた液状化対策工事を前倒しで実施します。6月議会において、予算が可決されたことから、今年度中の工事発注を目指し、作業を進めます。
