金沢市涌波町第一土地区画整理事業共同施行換地図

縮尺 300分の1

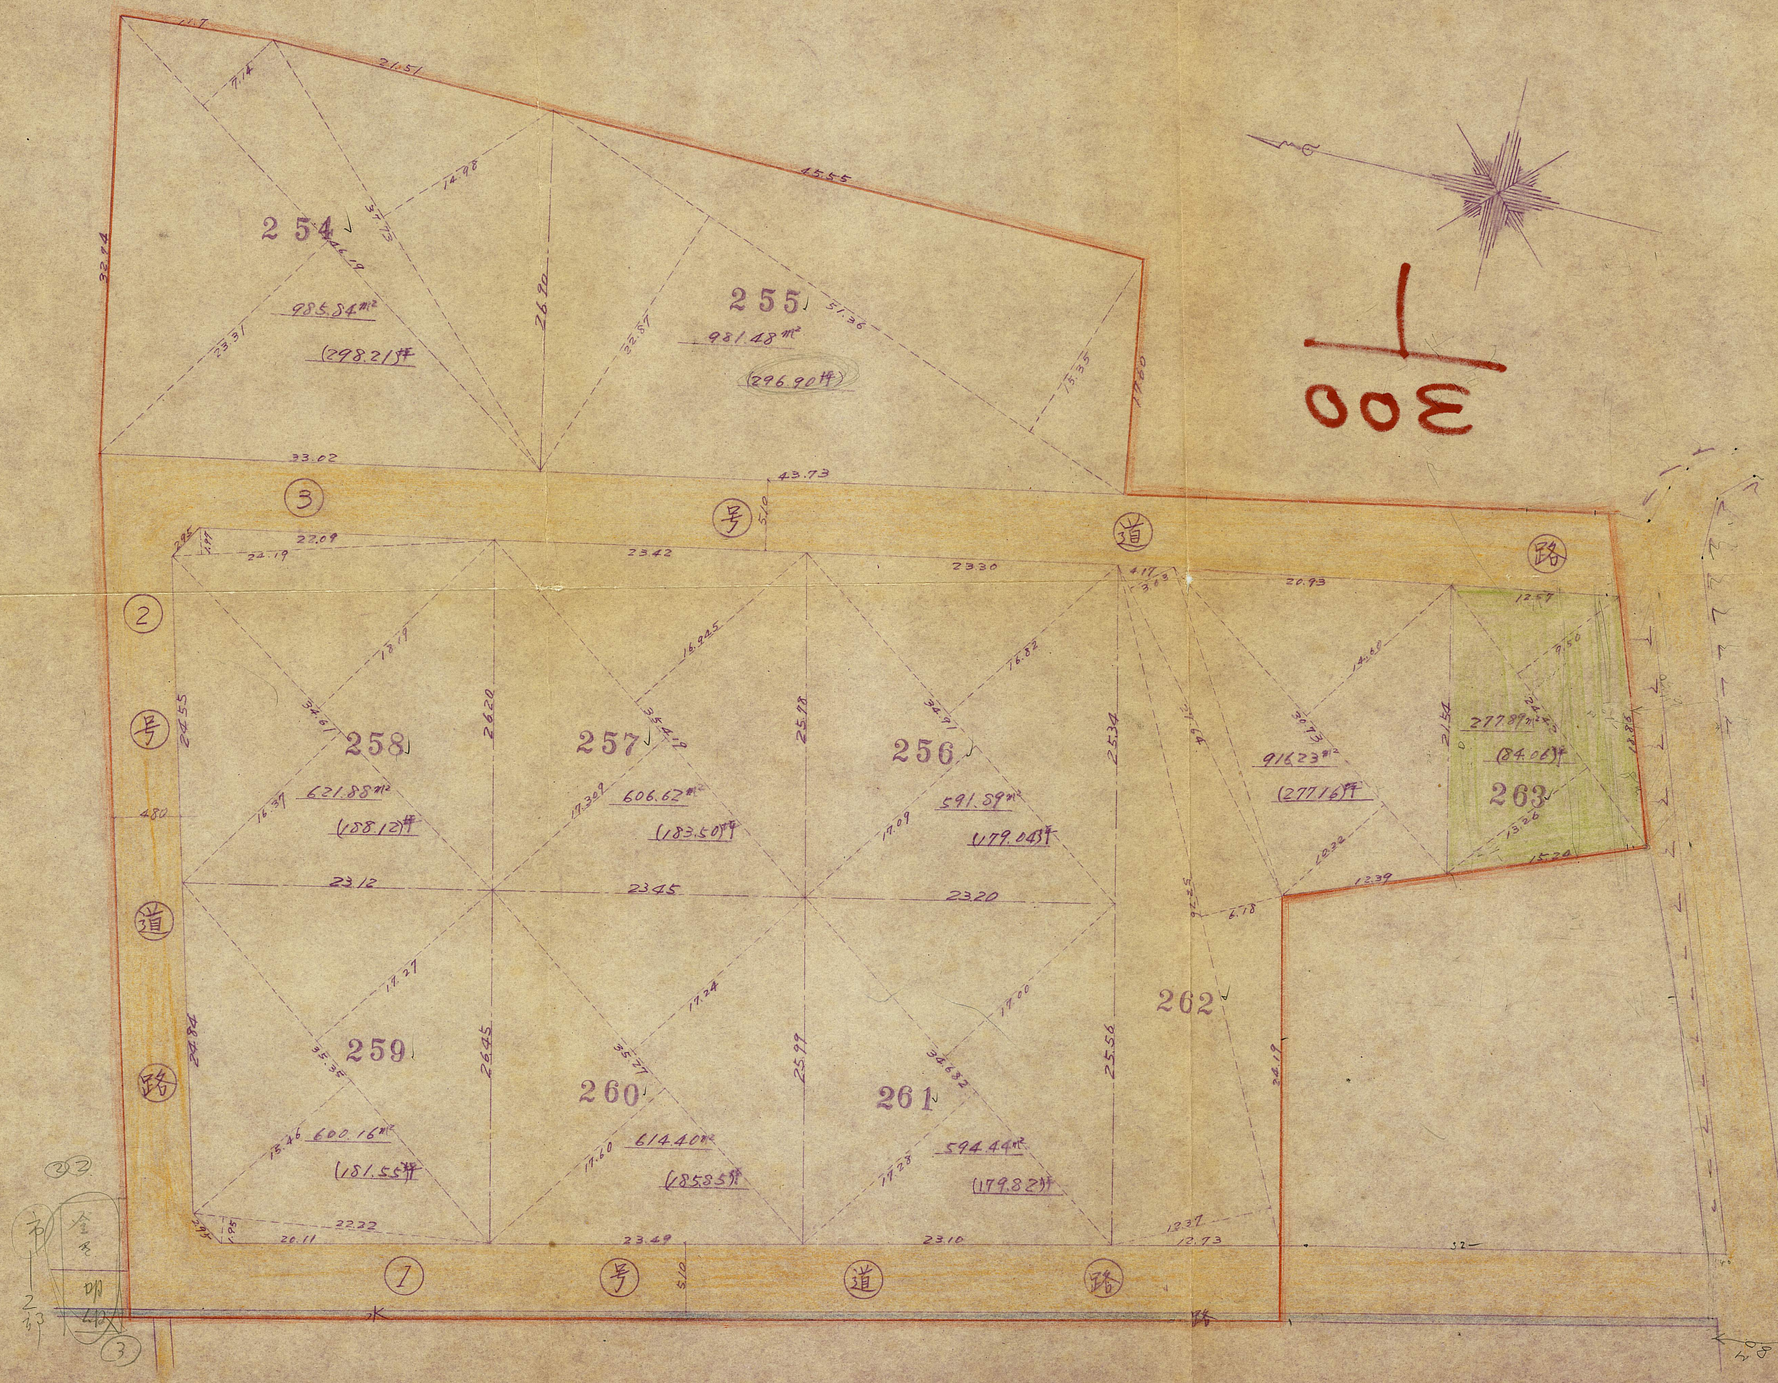

単位＝M

面積計算

254
14.98 × 37.73 = 565.1954
(7.14+23.31) × 46.19 = 1406.4855 (+
1971.6809 / 2 = 985.84045 m²
985.84045 × 0.3025 = 298.21~~6736125~~ 坪

255
(22.87+15.35) × 51.36 / 2 = 981.4896 m²
981.4896 × 0.3025 = 296.90~~0604~~ 坪

256
(17.09+16.82) × 34.91 / 2 = 591.89905 m²
591.89905 × 0.3025 = 179.04~~9462625~~ 坪

257
(16.945+17.309) × 35.419 / 2 = 606.621213 m²
606.621213 × 0.3025 = 183.50~~29169325~~ 坪

258
1.97 × 24.19 = 47.6543
(16.37+18.19) × 34.61 = 1196.1216 (+
1243.7759 / 2 = 621.88795 m²
621.88795 × 0.3025 = 188.12~~1104875~~ 坪

259
(17.27+15.46) × 35.35 = 1157.0055
1.95 × 22.22 = 43.3290 (+
1200.3345 / 2 = 600.16725 m²
600.16725 × 0.3025 = 181.55~~0593125~~ 坪

260
(17.24+17.60) × 35.27 / 2 = 614.4034 m²
614.4034 × 0.3025 = 185.85~~70285~~ 坪

261
(17.00+17.28) × 34.682 / 2 = 594.44948 m²
594.44948 × 0.3025 = 179.82~~09677~~ 坪

262
(6.18+12.37) × 52.26 = 969.4230
3.63 × 27.64 = 100.3332
(14.60+10.22) × 30.73 = 762.7186 (+
1832.4748 / 2 = 916.2374 m²
916.2374 × 0.3025 = 277.16~~18135~~ 坪

263
(9.50+13.26) × 24.42 / 2 = 277.8996 m²
277.8996 × 0.3025 = 84.06429 坪

合計 6790.83 m²
(2054.21) 坪

金沢市彦三町1丁目4番19号
浜詰測量設計事務所
